LEMUS CONSTRUCTION
ROOFING AND SIDING

OFFICE 215-996-9966
Email: info@lemusconstruction.com

Project Start: Mon, 3/10/2025
Display Week: 3

ROOF REMEDIATION PROJECT SCHEDULE STAGE # 1	PLYWOOD REPLACEMENT	PROGRESS	START	END
(1) 273 - 275 - 277 - 279 FAIRWAY DRIVE	0.00%	100%	3/10/25	3/15/25
(2) 265 - 267 - 269 - 271 FAIRWAY DRIVE	0.00%	100%	3/17/25	3/22/25
(3) 257 - 259 - 261 - 263 FAIRWAY DRIVE	0.00%	100%	3/24/25	3/29/25
(4) 249 - 251 - 253 - 255 FAIRWAY DRIVE	0.00%	85%	3/31/25	4/11/25
(5) 241 - 243 - 245 - 247 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	4/14/25	4/19/25
(6) 233 - 235 - 237 -239 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	4/21/25	4/26/25
(7) 225 - 227 - 229 - 231 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	4/28/25	5/3/25
(8) 217 - 219 - 221 - 223 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	5/5/25	5/10/25
(9) 209 - 211 - 213 - 215 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	5/12/25	5/17/25
(10) 201 - 203 - 205 - 207 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	5/19/25	5/24/25
(11) 193 - 195 - 197 -199 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	5/27/25	5/31/25
(12) 185 - 187 - 189 - 191 VILLA DRIVE	0.00%	0%	6/2/25	6/7/25
(1) 110 - 112 - 114 - 116 VILLA DRIVE	0.00%	100%	3/10/25	3/15/25
(2) 102 - 104 - 106 - 108 VILLA DRIVE	0.00%	100%	3/17/25	3/22/25
(3) 94 - 96 - 98 - 100 VILLA DRIVE	0.00%	100%	3/24/25	3/29/25
(4) 86 - 88 - 90 - 92 VILLA DRIVE	0.00%	78%	3/31/25	4/12/25
(5) 78 - 80 - 82 - 84 VILLA DRIVE	0.00%	0%	4/14/25	4/19/25
(6) 70 - 72 - 74 - 76 VILLA DRIVE	0.00%	0%	4/21/25	4/26/25
(7) 62 - 64 - 66 - 68 VILLA DRIVE	0.00%	0%	4/28/25	5/3/25
(8) 54 - 56 - 58 - 60 VILLA DRIVE	0.00%	0%	5/5/25	5/10/25
(9) 46 - 48 - 50 - 52 VILLA DRIVE	0.00%	0%	5/12/25	5/17/25
(10) 38 - 40 - 42 - 44 VILLA DRIVE	0.00%	0%	5/19/25	5/24/25
(11) 30 - 32 - 34 - 36 VILLA DRIVE	0.00%	0%	5/27/25	5/31/25
(12) 22 - 24 - 26 - 28 VILLA DRIVE	0.00%	0%	6/2/25	6/7/25

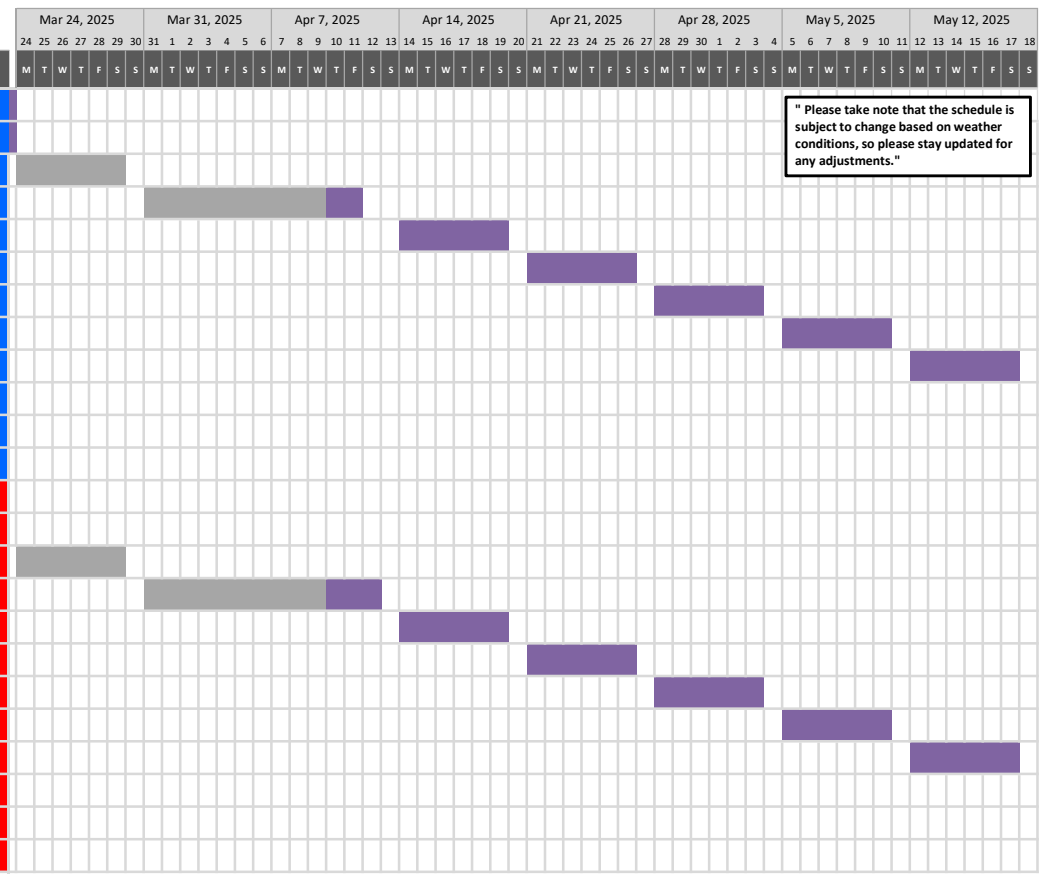

Mon, 3/3/2025
Display Week: 13

ROOF REMEDIATION PROJECT SCHEDULE STAGE # 2	PLYWOOD REPLACEMENT	PROGRESS	START	END
(13) 177 - 179 - 181 - 183 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(14) 169 - 171 - 173 - 175 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(15) 161 - 163 - 165 - 167 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(16) 153 - 155 - 157 - 159 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(17) 145 - 147 - 149 - 151 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(18) 137 - 139 - 141 - 143 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(19) 129 - 131 - 133 - 135 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(20) 121 - 123 - 125 - 127 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(21) 113 - 115 - 117 - 119 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(22) 105 - 107 - 109 - 111 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(23) 97 - 99 - 101 - 103 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(24) 89 - 91 - 93 - 95 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(13) 300 - 302 - 304 - 306 CLUBHOUSE DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(14) 308 - 310 - 312 - 314 CLUBHOUSE DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(15) 316 - 318 - 320 - 322 CLUBHOUSE DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(16) 324 - 326 - 328 - 330 CLUBHOUSE DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(17) 118 - 120 - 122 - 124 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(18) 126 - 128 - 130 - 132 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(19) 134 - 136 - 138 - 140 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(20) 142 - 144 - 146 - 148 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(21) 150 - 152 - 154 - 156 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(22) 158 - 160 - 162 - 164 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(23) 166 - 168 - 170 - 172 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(24) 2 - 4 - 6 - 8 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD

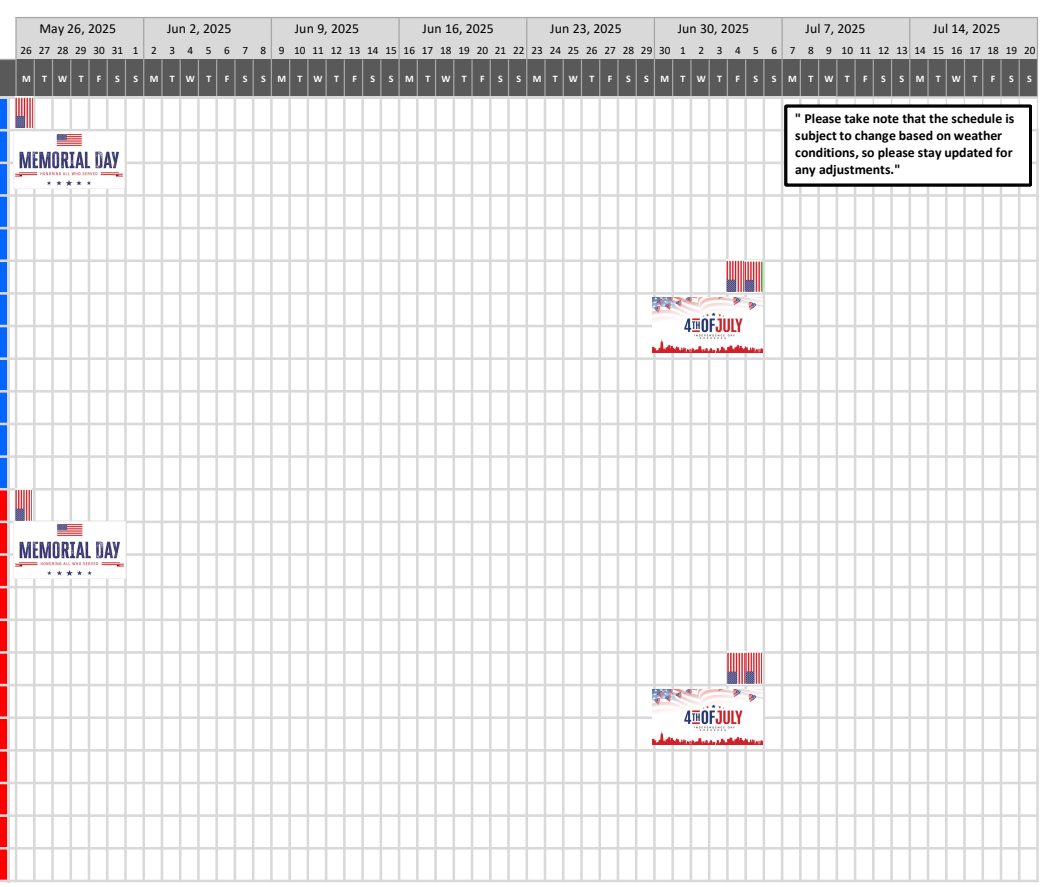

Mon, 3/3/2025
Display Week: 25
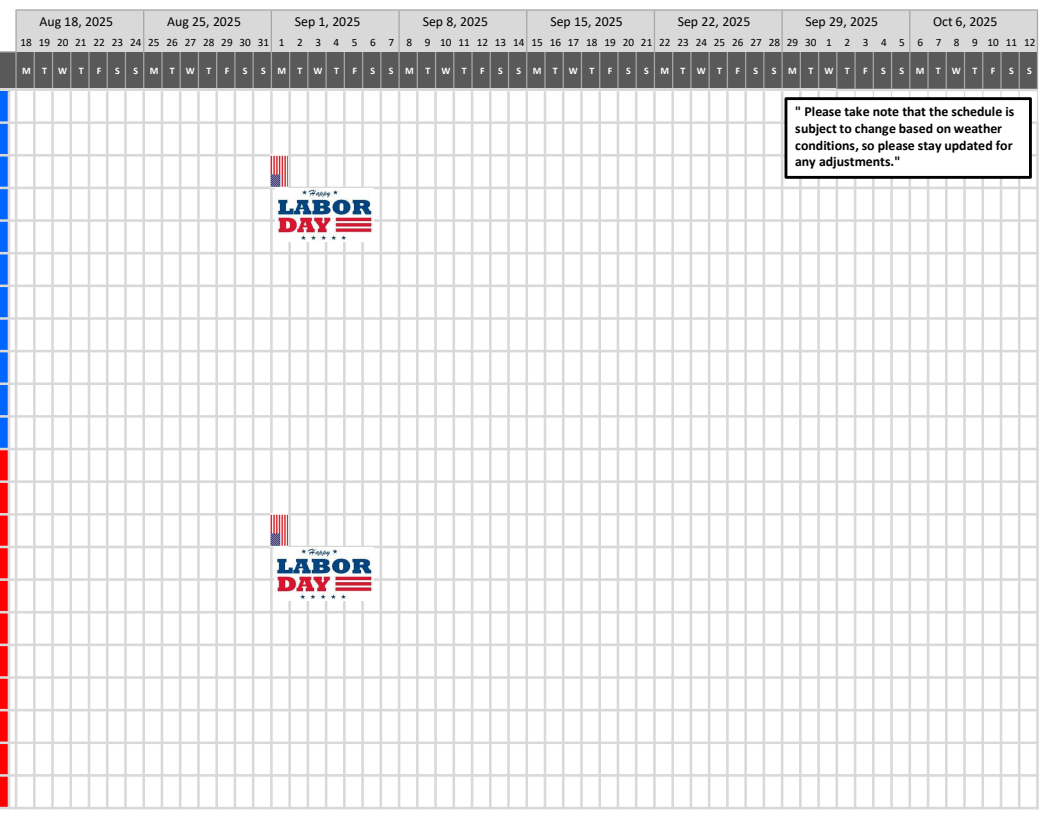
ROOF REMEDIATION PROJECT SCHEDULE STAGE # 3	PLYWOOD REPLACEMENT	PROGRESS	START	END
(25) 81 - 83 - 85 - 87 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(26) 73 - 75 - 77 - 79 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(27) 65 - 67 - 69 - 71 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(28) 57 - 59 - 61 - 63 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(29) 49 - 51 - 53 - 55 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(30) 41 - 43 - 45 - 47 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(31) 33 - 35 - 37 - 39 VILLA DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(32) 25 - 27 - 29 - 31 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(33) 17 - 19 - 21 - 23 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(34) 9 - 11 - 13 - 15 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(35) 1 - 3 - 5 - 7 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(25) 10 - 12 - 14 - 16 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(26) 18 - 20 - 22 - 24 FAIRWAY DRIVE	0.00%	0%	TBD	TBD
(27) 81 - 82 - 83 - 84 FIVE POND CIRCLE	0.00%	0%	TBD	TBD
(28) 71 - 72 - 73 - 74 FIVE POND CIRCLE	0.00%	0%	TBD	TBD
(29) 61 - 62 - 63 - 64 FIVE POND CIRCLE	0.00%	0%	TBD	TBD
(30) 51 - 52 - 53 - 54 FIVE POND CIRCLE	0.00%	0%	TBD	TBD
(31) 41 - 42 - 43 - 44 FIVE POND CIRCLE	0.00%	0%	TBD	TBD
(32) 31 - 32 - 33 - 34 FIVE POND CIRCLE	0.00%	0%	TBD	TBD
(33) 21 - 22 - 23 - 24 FIVE POND CIRCLE	0.00%	0%	TBD	TBD
(34) 11 - 12 - 13 - 14 FIVE POND CIRCLE	0.00%	0%	TBD	TBD
(35) 1 - 2 - 3 - 4 FIVE POND CIRCLE	0.00%	0%	TBD	TBD
